



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 35

O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE

za okres 07.06.2014 r. – 13.06.2014 r.

data aktualizacji 13.06.2014 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

1. Nazwa i numer Projektu.

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.

2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 67,9917708547% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

Wartość Projektu	37 217 082,23 PLN
Kwota dofinansowania	18 000 000,00 PLN

3. Strony procesu inwestycyjnego.

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Inżynier Kontraktu: NBQ Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin

Nadzór Autorski: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

Wykonawca: ENERGOPOL-SZCZECIN SA
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 28 702 134,23 PLN netto



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

6 601 490,87 PLN należny podatek VAT

35 303 625,10 PLN brutto

5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacji kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- kontynuowane są prace przy kanalizacji deszczowej od studni D istniejąca w kierunku ul. Narutowicza;



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

- trwają prace montażowe przy rurociągu gazowym w ul. Potulickiej, od ul. Sowińskiego w kierunku osiedla Pionierów II;
- kontynuowane są prace renowacyjne przy kanale ogólnospławnym w ul. Narutowicza;
- trwa montaż sieci ogólnospławnej od ul. Czarnieckiego w kierunku ul. Sowińskiego;
- trwają prace przy układaniu rur osłonowych przy pętli tramwajowej na ul. Potulickiej;
- układane są rury przepustowe na wysokości ul. Czarnieckiego i ul. Sowińskiego;
- wykonywane jest koryto pod drogę na odcinku ul. Narutowicza, od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej;
- przerwane zostały roboty na pętli tramwajowej w ul. Potulickiej z powodu ujawnienia szczątków ludzkich i fragmentów trumien;
- na ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Kaszubską wykonywano wzmocnienie istniejącego podłoża pod konstrukcję drogi i torowiska;
- na odcinku ul. 3 Maja, objętego inwestycją. Zakończono rozbiórkę podkładów tramwajowych i tłucznia.

8. Dokumentacja fotograficzna



ul. Potulicka – teren pętli tramwajowej



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka – teren pętli tramwajowej



ul. Potulicka

Inżynier Kontraktu:
NBQ Spółka z o.o.
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Pomorze
Zachodnie**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka



ul. 3 Maja

Inżynier Kontraktu:
NBQ Spółka z o.o.
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



roboty renowacyjne na kanale ogólnospławnym w ul. Narutowicza

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia

Od dnia 15.04.2014 r. Wykonawca wprowadził zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Wdrożony został etap 2a projektu „Czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Potulickiej w Szczecinie”, zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina (decyzja z dnia 17.02.2014 r., znak: WGKiOŚ-III.7221.C-066.2014.WD, nr zatwierdzenia: C-066/2014).

W dalszym ciągu wiążące są zamknięcia z etapu pierwszego obejmujące ul. Piekary oraz ul. Czarnieckiego. Dodatkowo z ruchu wyłączona została ul. Potulicka na odcinku od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Narutowicza wraz z tym skrzyżowaniem oraz ul. Narutowicza. Na ul. Narutowicza, pomiędzy Pl. Dziecka a ul. Potulicką, ruch został ograniczony do jednego pasa ruchu. Przed obszarem wyłączonym z ruchu wykonany został tymczasowy przejazd przez pas rozdziału umożliwiający zawracanie.

Przez plac budowy zapewnione zostały dojazdy do posesji dla mieszkańców, zaopatrzenia, służb komunalnych i ratunkowych jednak bez możliwości postoju w tym obszarze. Wzdłuż ul. Potulickiej, na placu budowy, wytyczono ciągi piesze – na ul. Potulickiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Narutowicza a ul. Czarnieckiego ciąg jednostronny, na pozostałym odcinku ul. Potulickiej oraz ul. Narutowicza ciągi dwustronne.

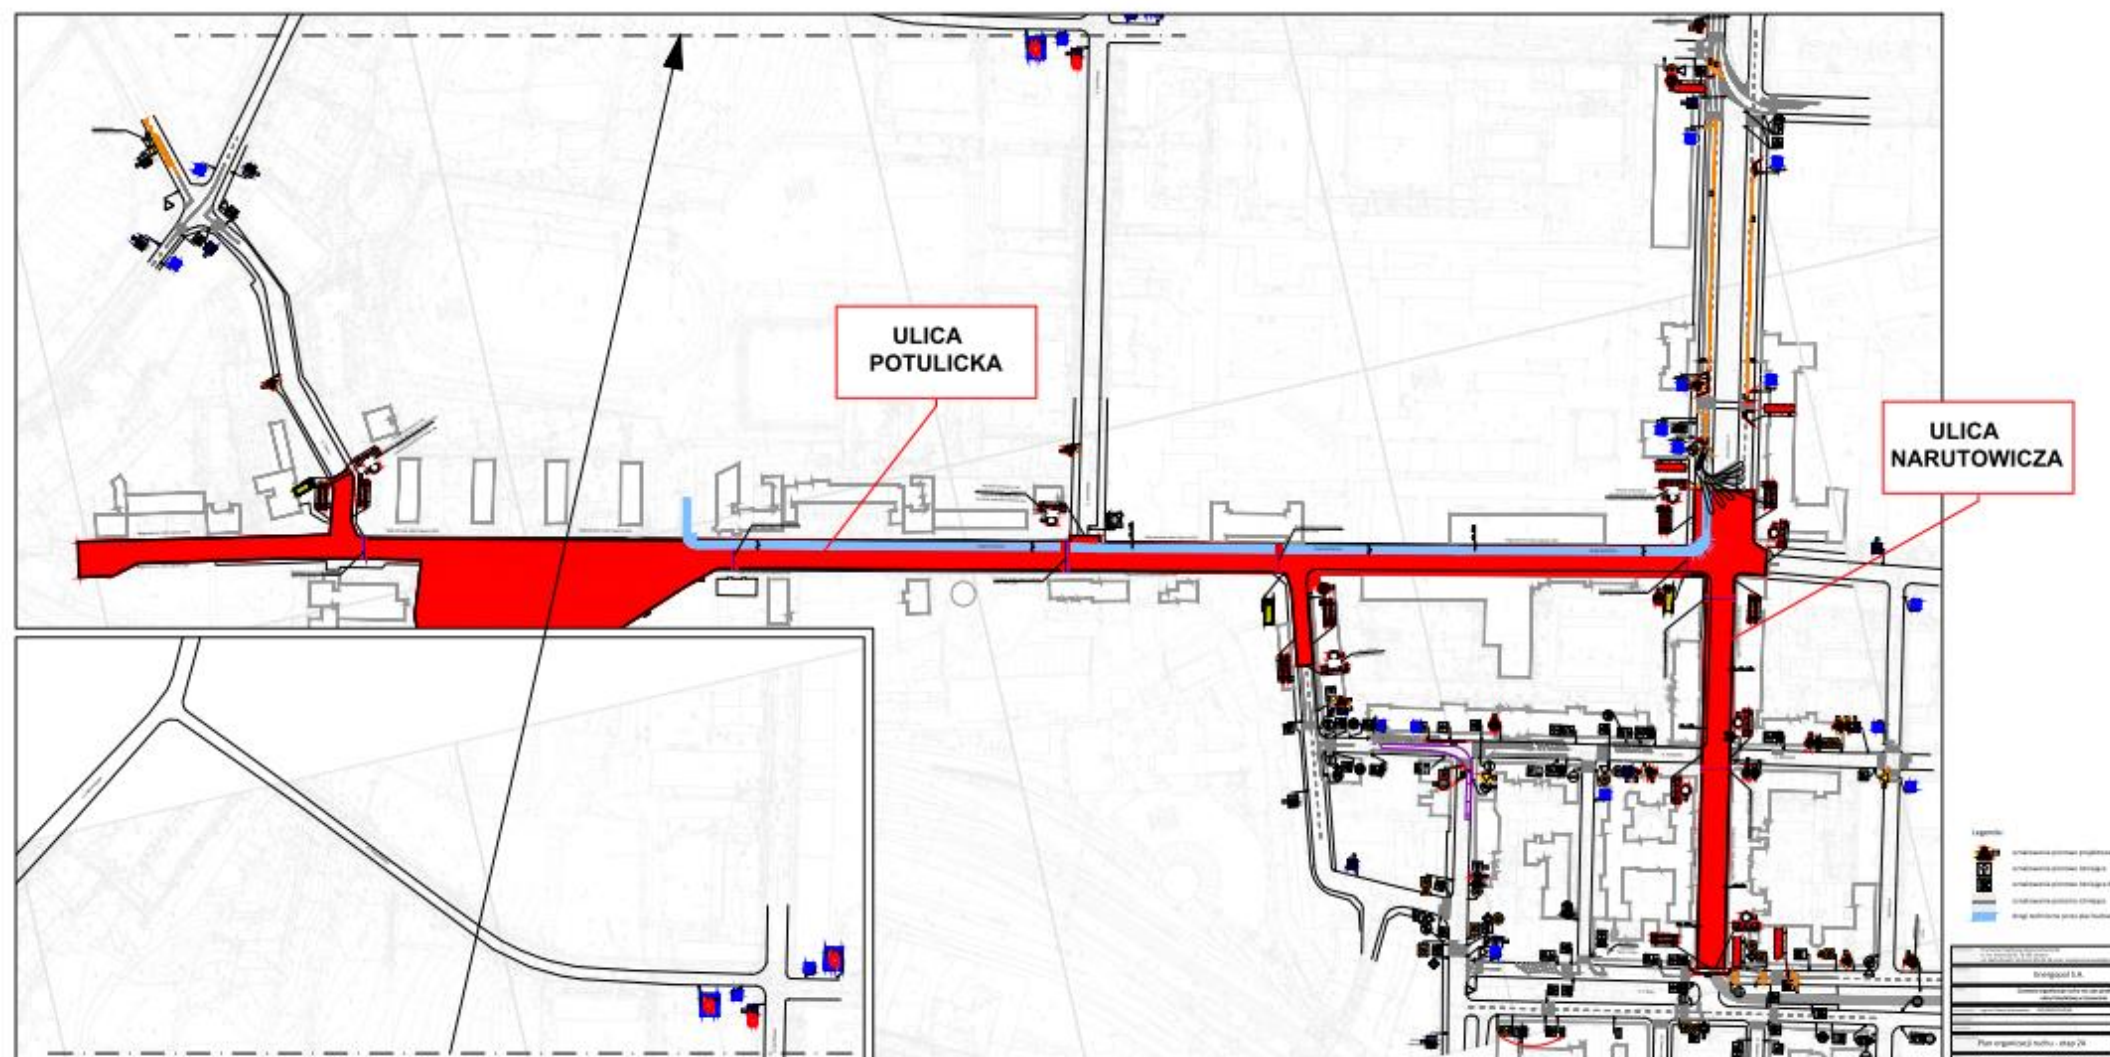
Zamiennie, za wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 1 i 9, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową - pomiędzy ul. Czarnieckiego a Bramą Portową kursuje linia nr 801, a pomiędzy ul. Grudziądzką a ul. Szyrockiego linia nr 809.

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska






„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



Legenda:

-  oznakowanie pionowe projektowan
-  oznakowanie pionowe istniejące
-  oznakowanie pionowe istniejące do
-  oznakowanie poziome istniejące
-  drogi techniczne przez plac budowy

Plan organizacji ruchu – etap 2a

Inżynier Kontraktu:
NBQ Spółka z o.o.
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12
