



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 82

O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE

za okres 01.05.2015 r. – 08.05.2015 r.

data aktualizacji 08.05.2015 r.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

1. Nazwa i numer Projektu.

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.

2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 67,9917708547% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

Wartość Projektu	37 217 082,23 PLN
Kwota dofinansowania	18 000 000,00 PLN

3. Strony procesu inwestycyjnego

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Inżynier Kontraktu: NBQ Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin

Nadzór Autorski: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

Wykonawca: ENERGOPOL-SZCZECIN SA
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa	28 702 134,23 PLN netto
	6 601 490,87 PLN należny podatek VAT
	35 303 625,10 PLN brutto

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- kontynuowano układanie tłucznia pod pokłady betonowe oraz układanie podkładów betonowych na torowisku na pętli tramwajowej w ul. Potulickiej;
- zespawano rozjazdy 7 i 8;
- połączono torowisko między ul. Potulicką a ul. Narutowicza;
- kontynuowano wykonanie regulacji torów oraz betonowanie warstwy dolnej i górnej podbudowy betonowej na łuku ul. Potulickiej i ul. Narutowicza;
- kontynuowano układanie chodnika oraz ustawianie krawężnika kamiennego na ul. Potulickiej na wysokości ul. Sowińskiego w kierunku pętli tramwajowej;
- prowadzone są prace brukarskie związane z układaniem kostki kamiennej od ul. Sowińskiego w kierunku pętli tramwajowej;
- wykonywano murek oporowy z kostki kamiennej na wysokości apteki na ul. Potulickiej;
- wykonywano ściek przykrawężnikowy na ul. Potulickiej na odcinku od ul. Sowińskiego w kierunku pętli tramwajowej;
- w bieżącym tygodniu nie prowadzono prac w branży elektrycznej ze względu na brak frontu robót – Wykonawca czeka na następny technologiczny etap robót - brak możliwości wykonywania sieci trakcyjnej ze względu na niebezpieczeństwo zerwania rozwieszanych przewodów trakcyjnych przez samochody dostarczające masę bitumiczną;
- wykonano nadlewkę fundamentową pod ogrodzenia od strony wojska na ul. Potulickiej;
- zabetonowano ławę fundamentową pod ogrodzenie od strony policji na ul. Potulickiej.

8. Dokumentacja fotograficzna



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



skrzyżowanie ul. Potulickiej z ul. Narutowicza

9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia


W dniu 28.01.2015 r. na terenie budowy wprowadzona została czasowa organizacja ruchu - etap 2b, zgodnie z zatwierdzeniem C-157/2014 z dnia 22.08.2014 r. W stosunku do poprzedniego etapu (2a), utrzymane zostanie takie samo oznakowanie, zmieni się natomiast obsługa budowy od strony budowy osiedla Pionierów – dojazd od strony osiedla Pionierów odbywać się będzie drogą tymczasową od strony ulicy Piekary.

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

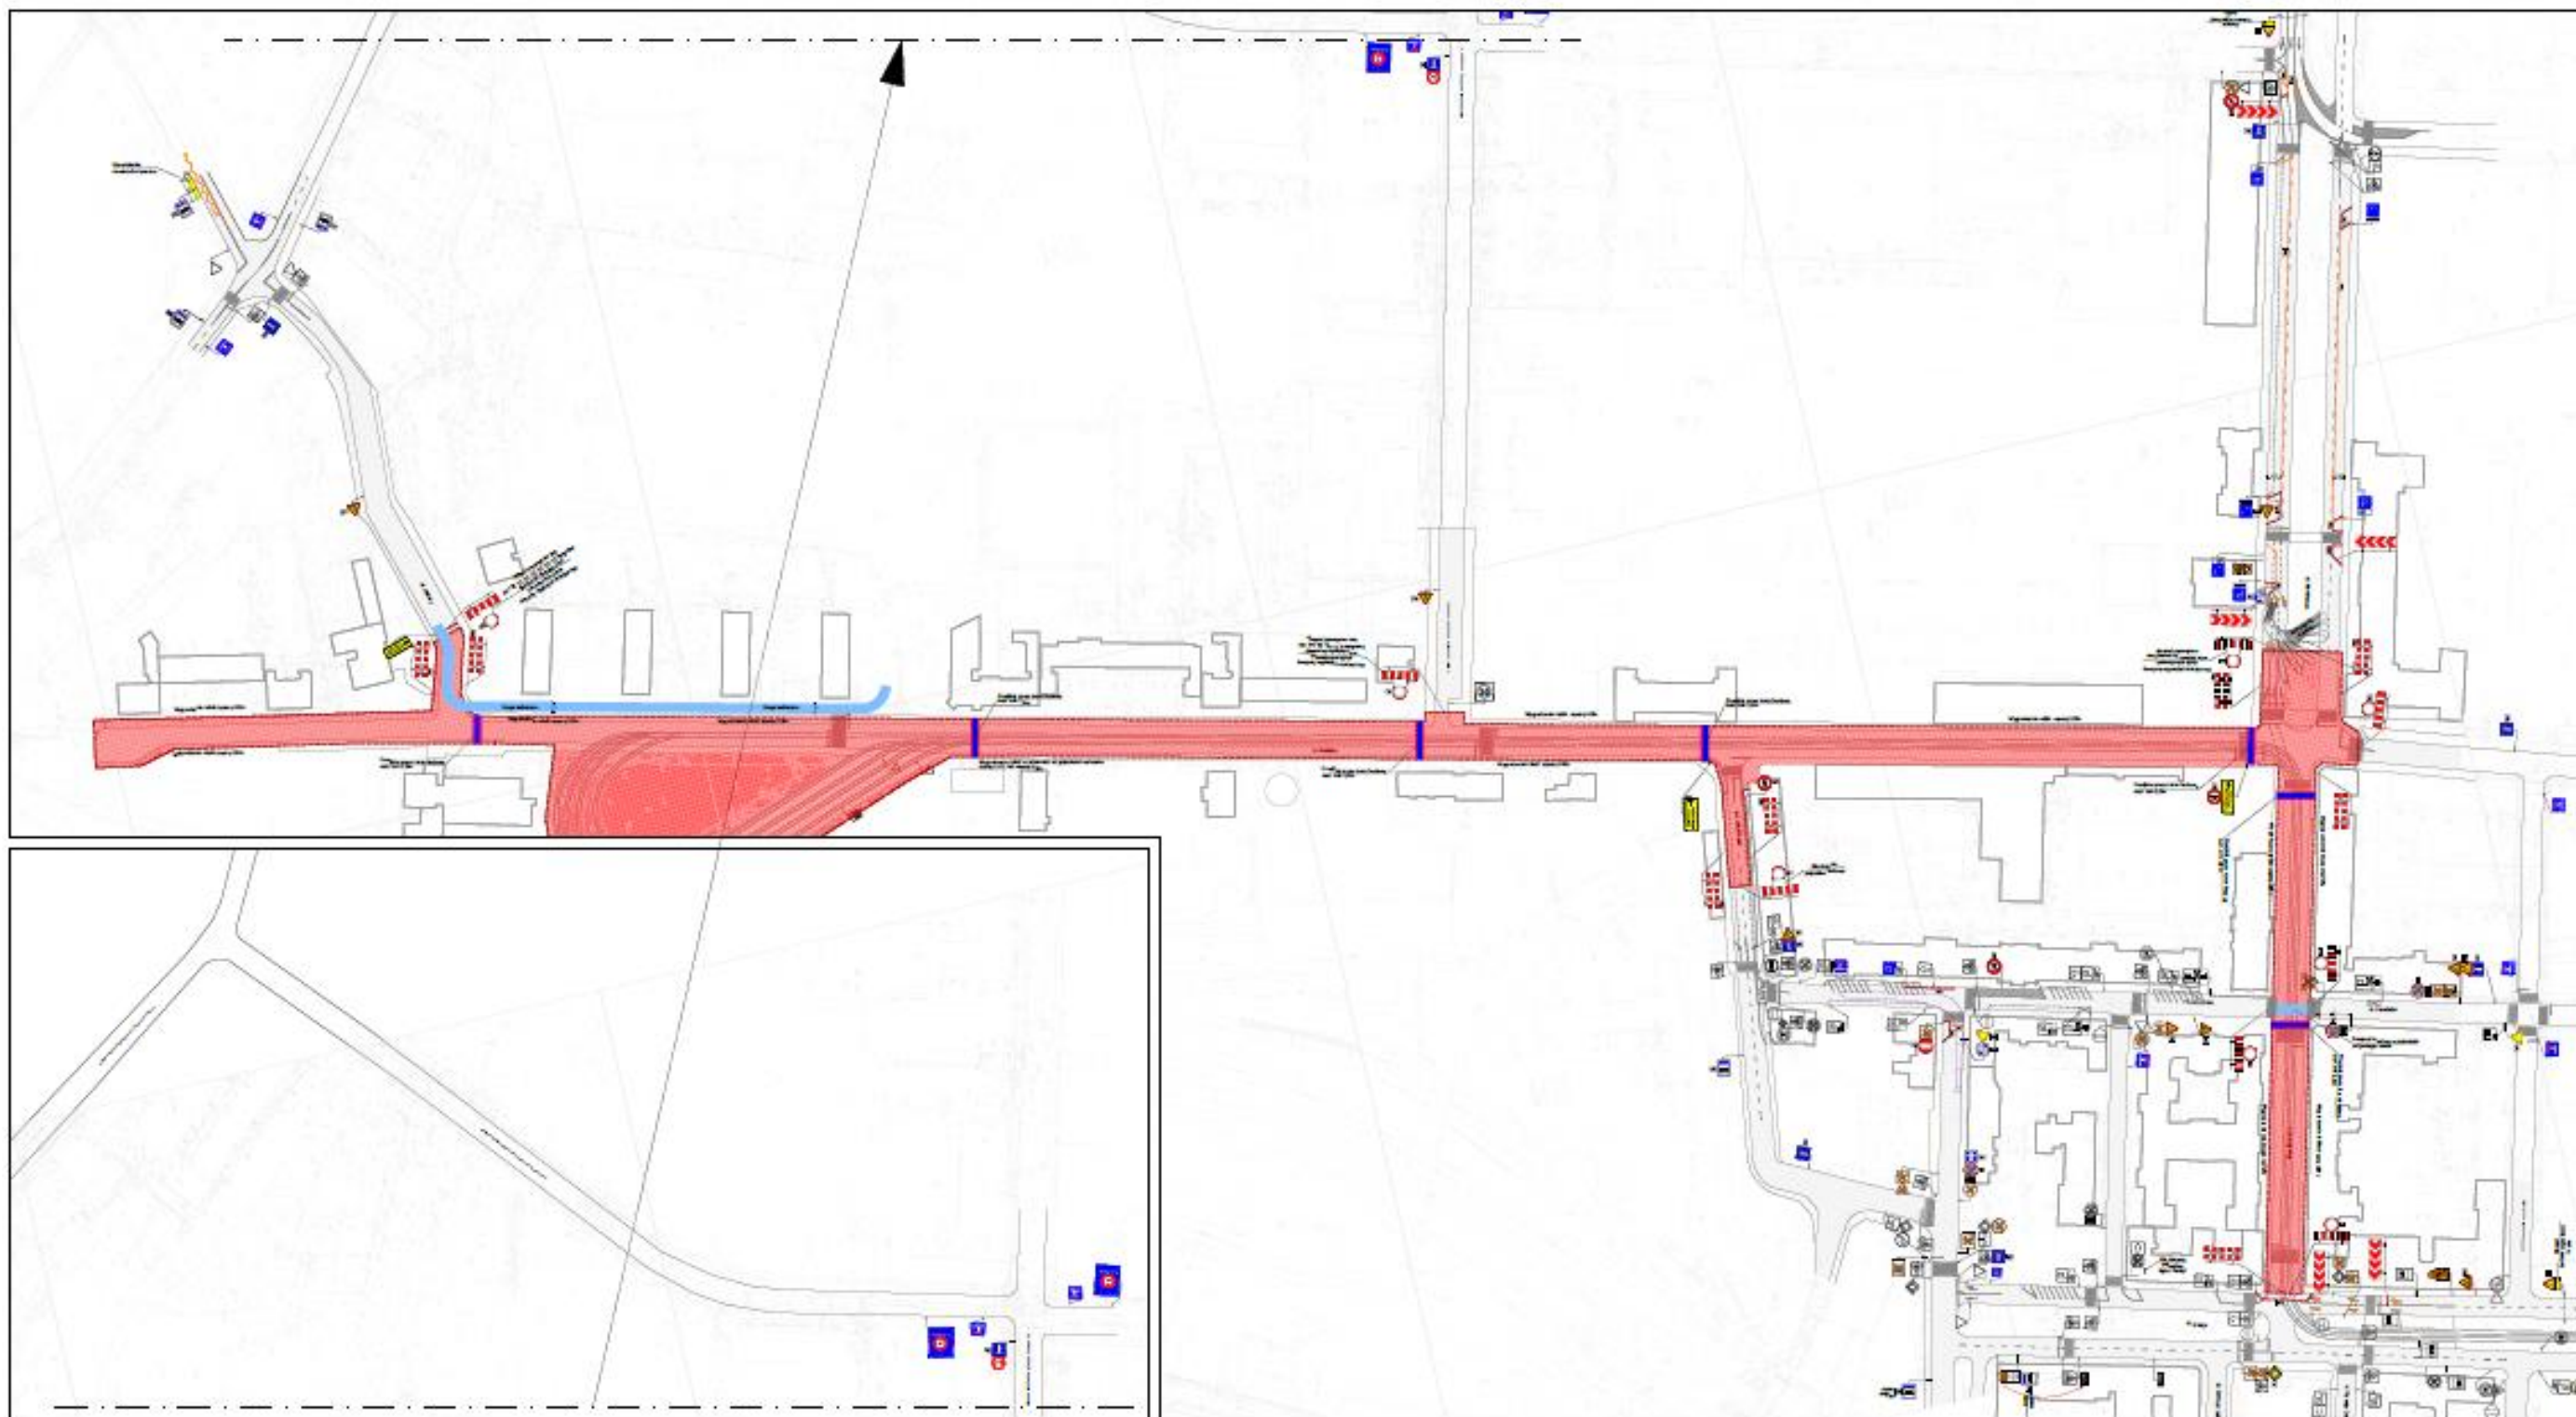

Plan organizacji ruchu – etap 2b
