



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 70**

### **O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE**

**za okres 07.02.2015 r. – 13.02.2015 r.**

data aktualizacji 13.02.2015 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

#### **1. Nazwa i numer Projektu.**

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.

#### **2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 67,9917708547% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

Wartość Projektu	37 217 082,23 PLN
Kwota dofinansowania	18 000 000,00 PLN

#### **3. Strony procesu inwestycyjnego**

<i>Zamawiający:</i>	Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
<i>Inżynier Kontraktu:</i>	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin
<i>Nadzór Autorski:</i>	Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin
<i>Wykonawca:</i>	ENERGOPOL-SZCZECIN SA ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

#### **4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane**

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa	28 702 134,23 PLN netto
	6 601 490,87 PLN należny podatek VAT
	35 303 625,10 PLN brutto

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

## 5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

## 6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

## 7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- kontynuowano wykonywanie przykanalików;
- kontynuowano roboty brukarskie na ul. Potulickiej, na odcinku od ul. Piekary do końca oraz na wysokości pętli tramwajowej, na wysokości ul. Sowińskiego, na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza;
- kontynuowane jest układanie warstw konstrukcyjnych jezdni i torowiska w ul. Potulickiej, na odcinku od ul. Piekary do osiedla Pionierów II oraz na odcinku pomiędzy ul. Czarnieckiego i ul. Narutowicza;
- prowadzono demontaż starych słupów oświetlenia ulicznego na ul. Potulickiej;
- kontynuowano wykonywanie wykopów pod słupy trakcyjne na ul. Potulickiej;
- kontynuowano ustawianie słupów trakcyjnych na ul. Potulickiej, na wysokości pętli tramwajowej i pawilonów handlowych;
- trwają prace przy usuwaniu kolizji kabla SN przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza z ul. Potulicką;
- trwa wymiana gruntu przy wjeździe na pętle tramwajową w ul. Potulickiej;
- ustawiano tory na rzędną wysokościową zgodną z projektem na ławie betonowej z betonu B30 na ul. Potulickiej, na odcinku pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Czarnieckiego;
- prowadzono betonowanie górnej warstwy torowiska z betonu B37 na ul. Potulickiej, na odcinku pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Czarnieckiego;
- wykonywana jest stabilizacja RM 2,5 MPa pod torowisko na ul. Potulickiej, na odcinku pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Czarnieckiego i na wysokości budynku nr 53 przy ul. Potulickiej.

## 8. Dokumentacja fotograficzna



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka



ul. Narutowicza



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---



ul. Potulicka





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia**


W dniu 28.01.2015 r. na terenie budowy wprowadzona została czasowa organizacja ruchu - etap 2b, zgodnie z zatwierdzeniem C-157/2014 z dnia 22.08.2014 r. W stosunku do poprzedniego etapu (2a), utrzymane zostanie takie samo oznakowanie, zmieni się natomiast obsługa budowy od strony budowy osiedla Pionierów – dojazd od strony osiedla Pionierów odbywać się będzie drogą tymczasową od strony ulicy Piekary.

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

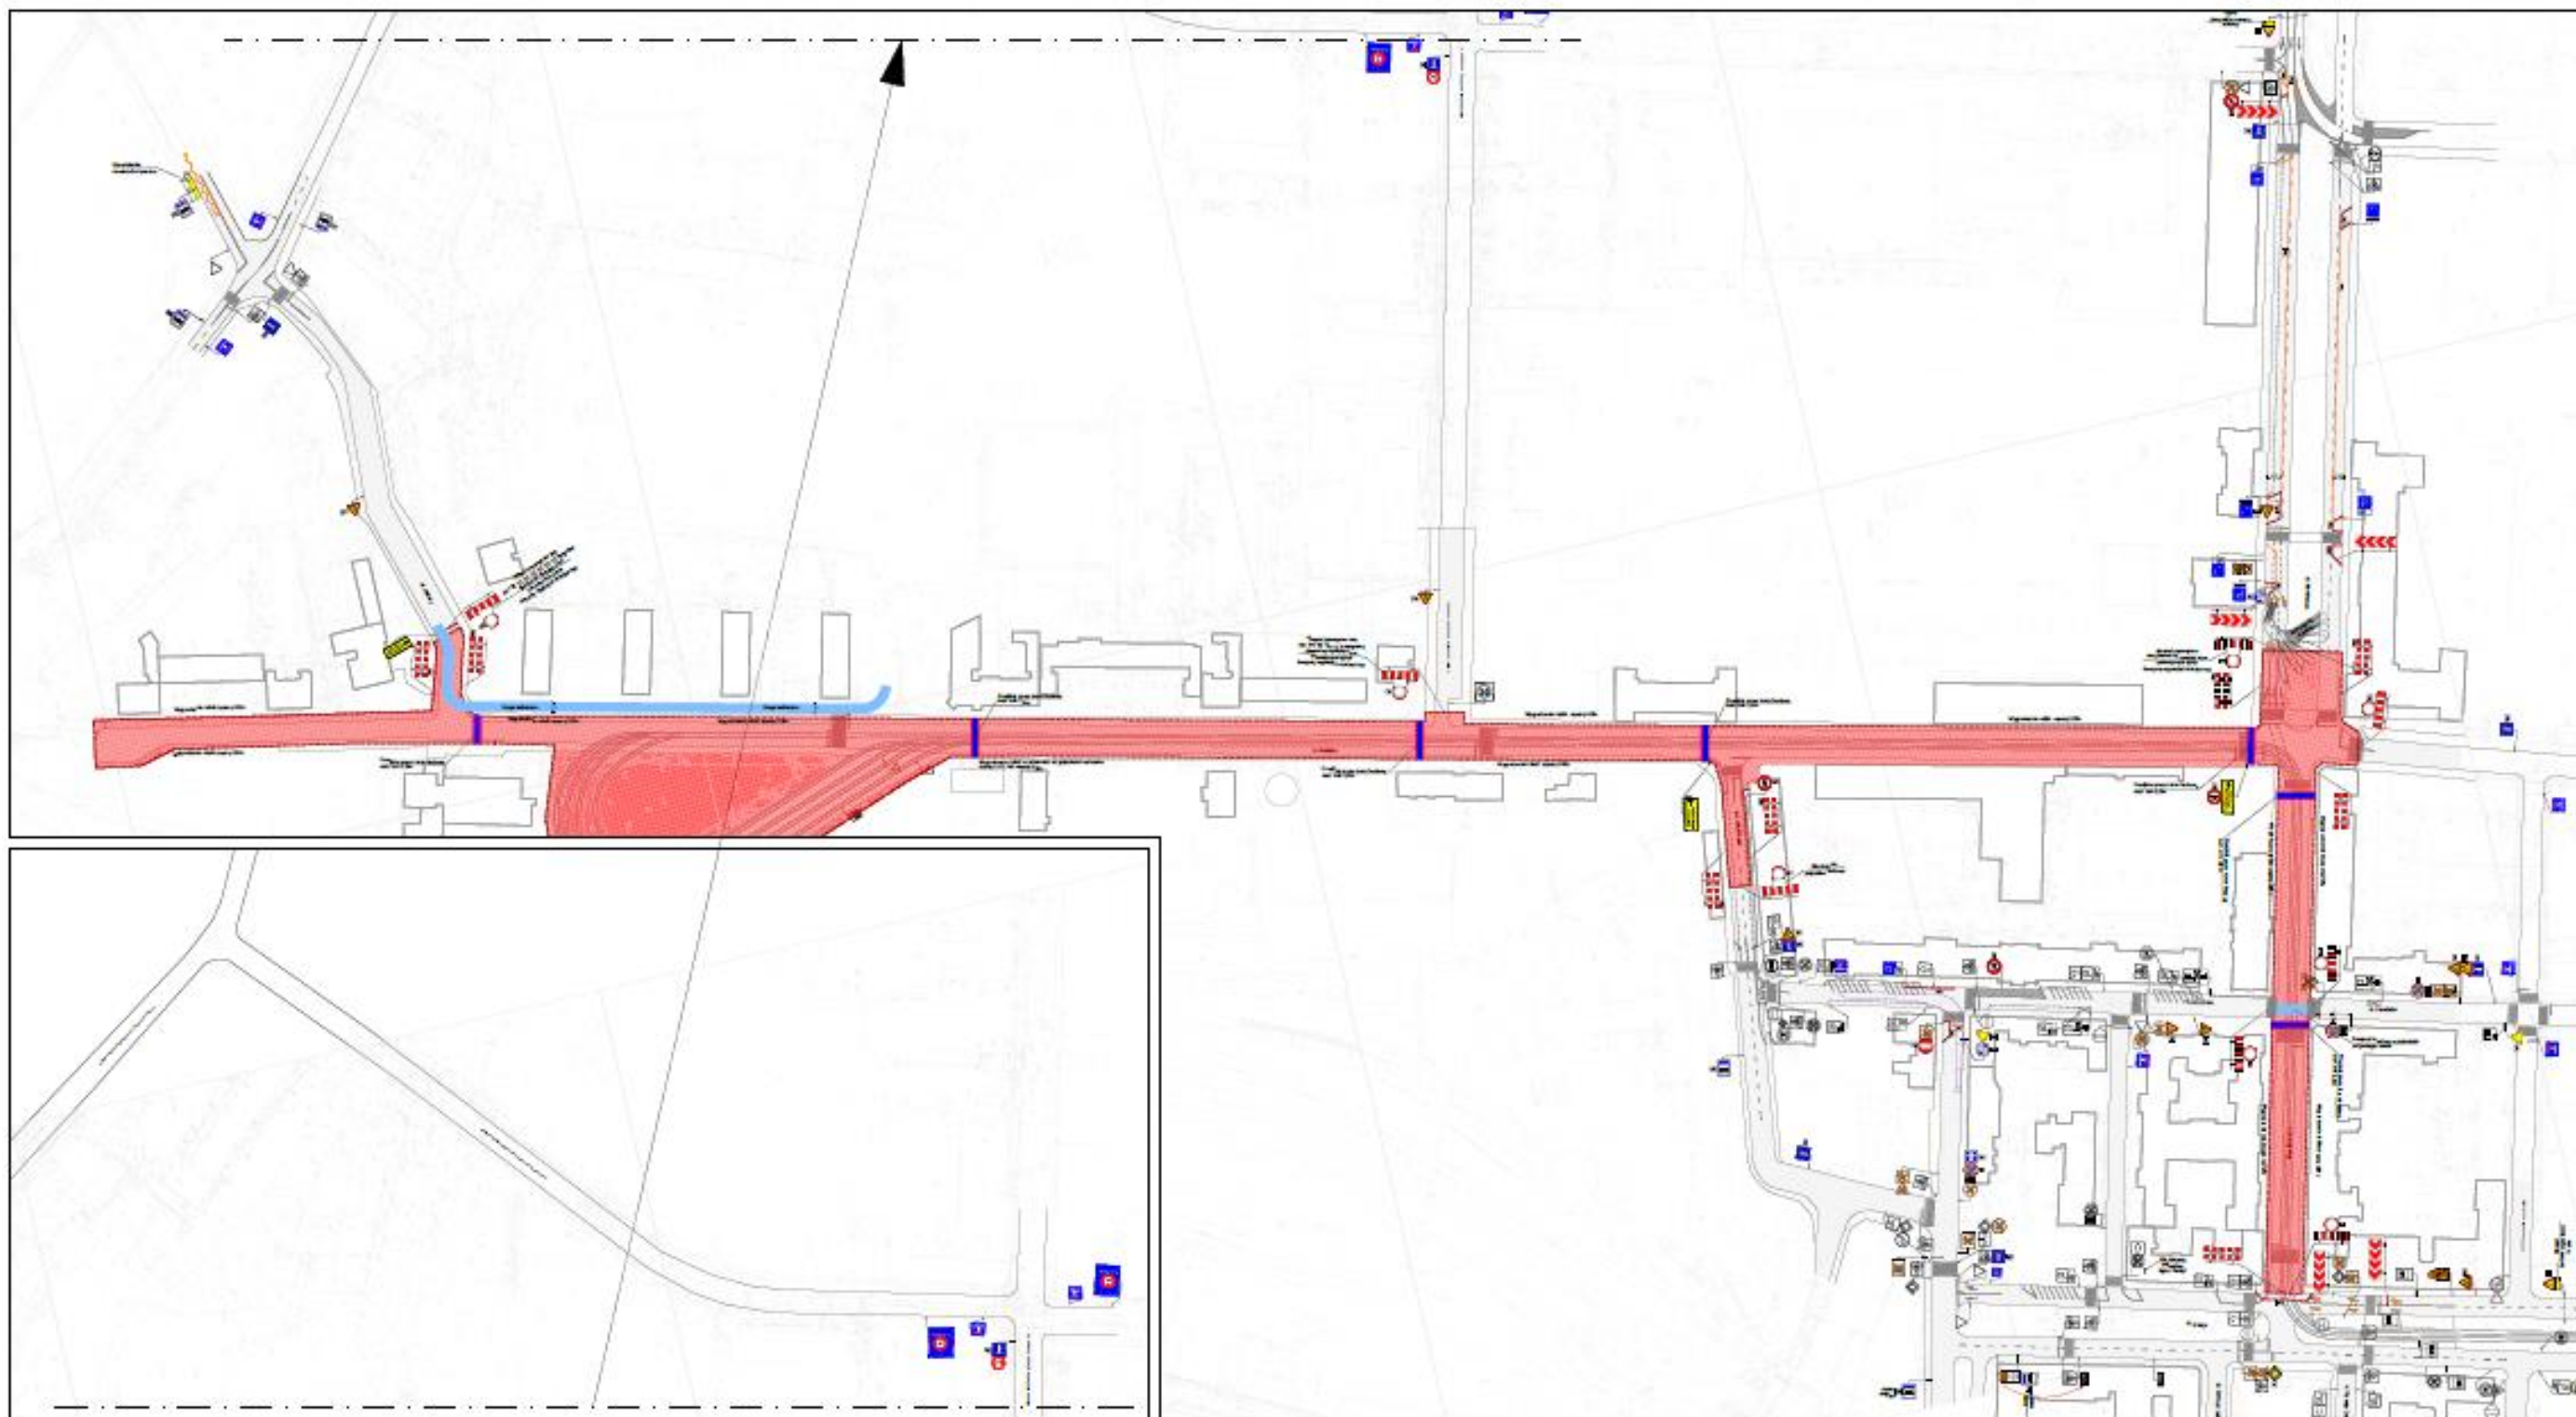

Plan organizacji ruchu – etap 2b
