



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 83**

### **O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE**

**za okres 09.05.2015 r. – 15.05.2015 r.**

data aktualizacji 15.05.2015 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

### **1. Nazwa i numer Projektu.**

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.  
wraz z Aneksami

### **2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 74,9999999717% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

Wartość Projektu	37 335 204,03 PLN
Kwota dofinansowania	17 999 999,00 PLN

### **3. Strony procesu inwestycyjnego**

*Zamawiający:* Gmina Miasto Szczecin  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

*Inżynier Kontraktu:* NBQ Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin

*Nadzór Autorski:* Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM  
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

*Wykonawca:* ENERGOPOL-SZCZECIN SA  
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

### **4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane**

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa	28 673 175,42 PLN netto
	6 594 830,35 PLN należny podatek VAT

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

35 268 005,77 PLN brutto

## 5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

## 6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

## 7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- kontynuowano układanie tłucznia pod pokłady betonowe oraz układanie podkładów betonowych wraz z mocowaniem szyn do podkładów na torowisku na pętli tramwajowej na ul. Potulickiej;
- zabetonowano torowisko na połączeniu ulic Potulickiej i Narutowicza;
- trwa betonowanie dolnej i górnej warstwy torowiska ul. Narutowicza w kierunku 3 Maja;
- prowadzone jest korytowanie oraz wykonanie stabilizacji cementem Rm 2,5MPa w ul. Czarnieckiego;
- wykonywany jest chodnik na wysokości apteki na ul. Potulickiej;
- wykonywanie chodników na pętli tramwajowej wraz z ustawieniem krawężnika kamiennego;
- wykonanie barier bezpieczeństwa na pętli tramwajowej, na ul. Potulickiej;
- wykonanie podbudowy betonowej pod rozjazd 2 i 3 na pętli tramwajowej;
- wykonanie spawów, regulacja wysokościowa szyn na ul Potulickiej na wysokości apteki;
- prowadzone są prace brukarskie związane z układaniem kostki kamiennej od ul. Sowińskiego w kierunku pętli tramwajowej, wykonywany jest ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej po obu stronach jezdni;
- zabetonowano stopę fundamentową pod filar bramy ogrodzeniowej od strony policji na ul. Potulickiej.

## 8. Dokumentacja fotograficzna





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka – pętla tramwajowa







„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---



ul. Potulicka



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia**

W dniu 28.01.2015 r. na terenie budowy wprowadzona została czasowa organizacja ruchu - etap 2b, zgodnie z zatwierdzeniem C-157/2014 z dnia 22.08.2014 r. W stosunku do poprzedniego etapu (2a), utrzymane zostanie takie samo oznakowanie, zmieni się natomiast obsługa budowy od strony budowy osiedla Pionierów – dojazd od strony osiedla Pionierów odbywać się będzie drogą tymczasową od strony ulicy Piekary.


Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

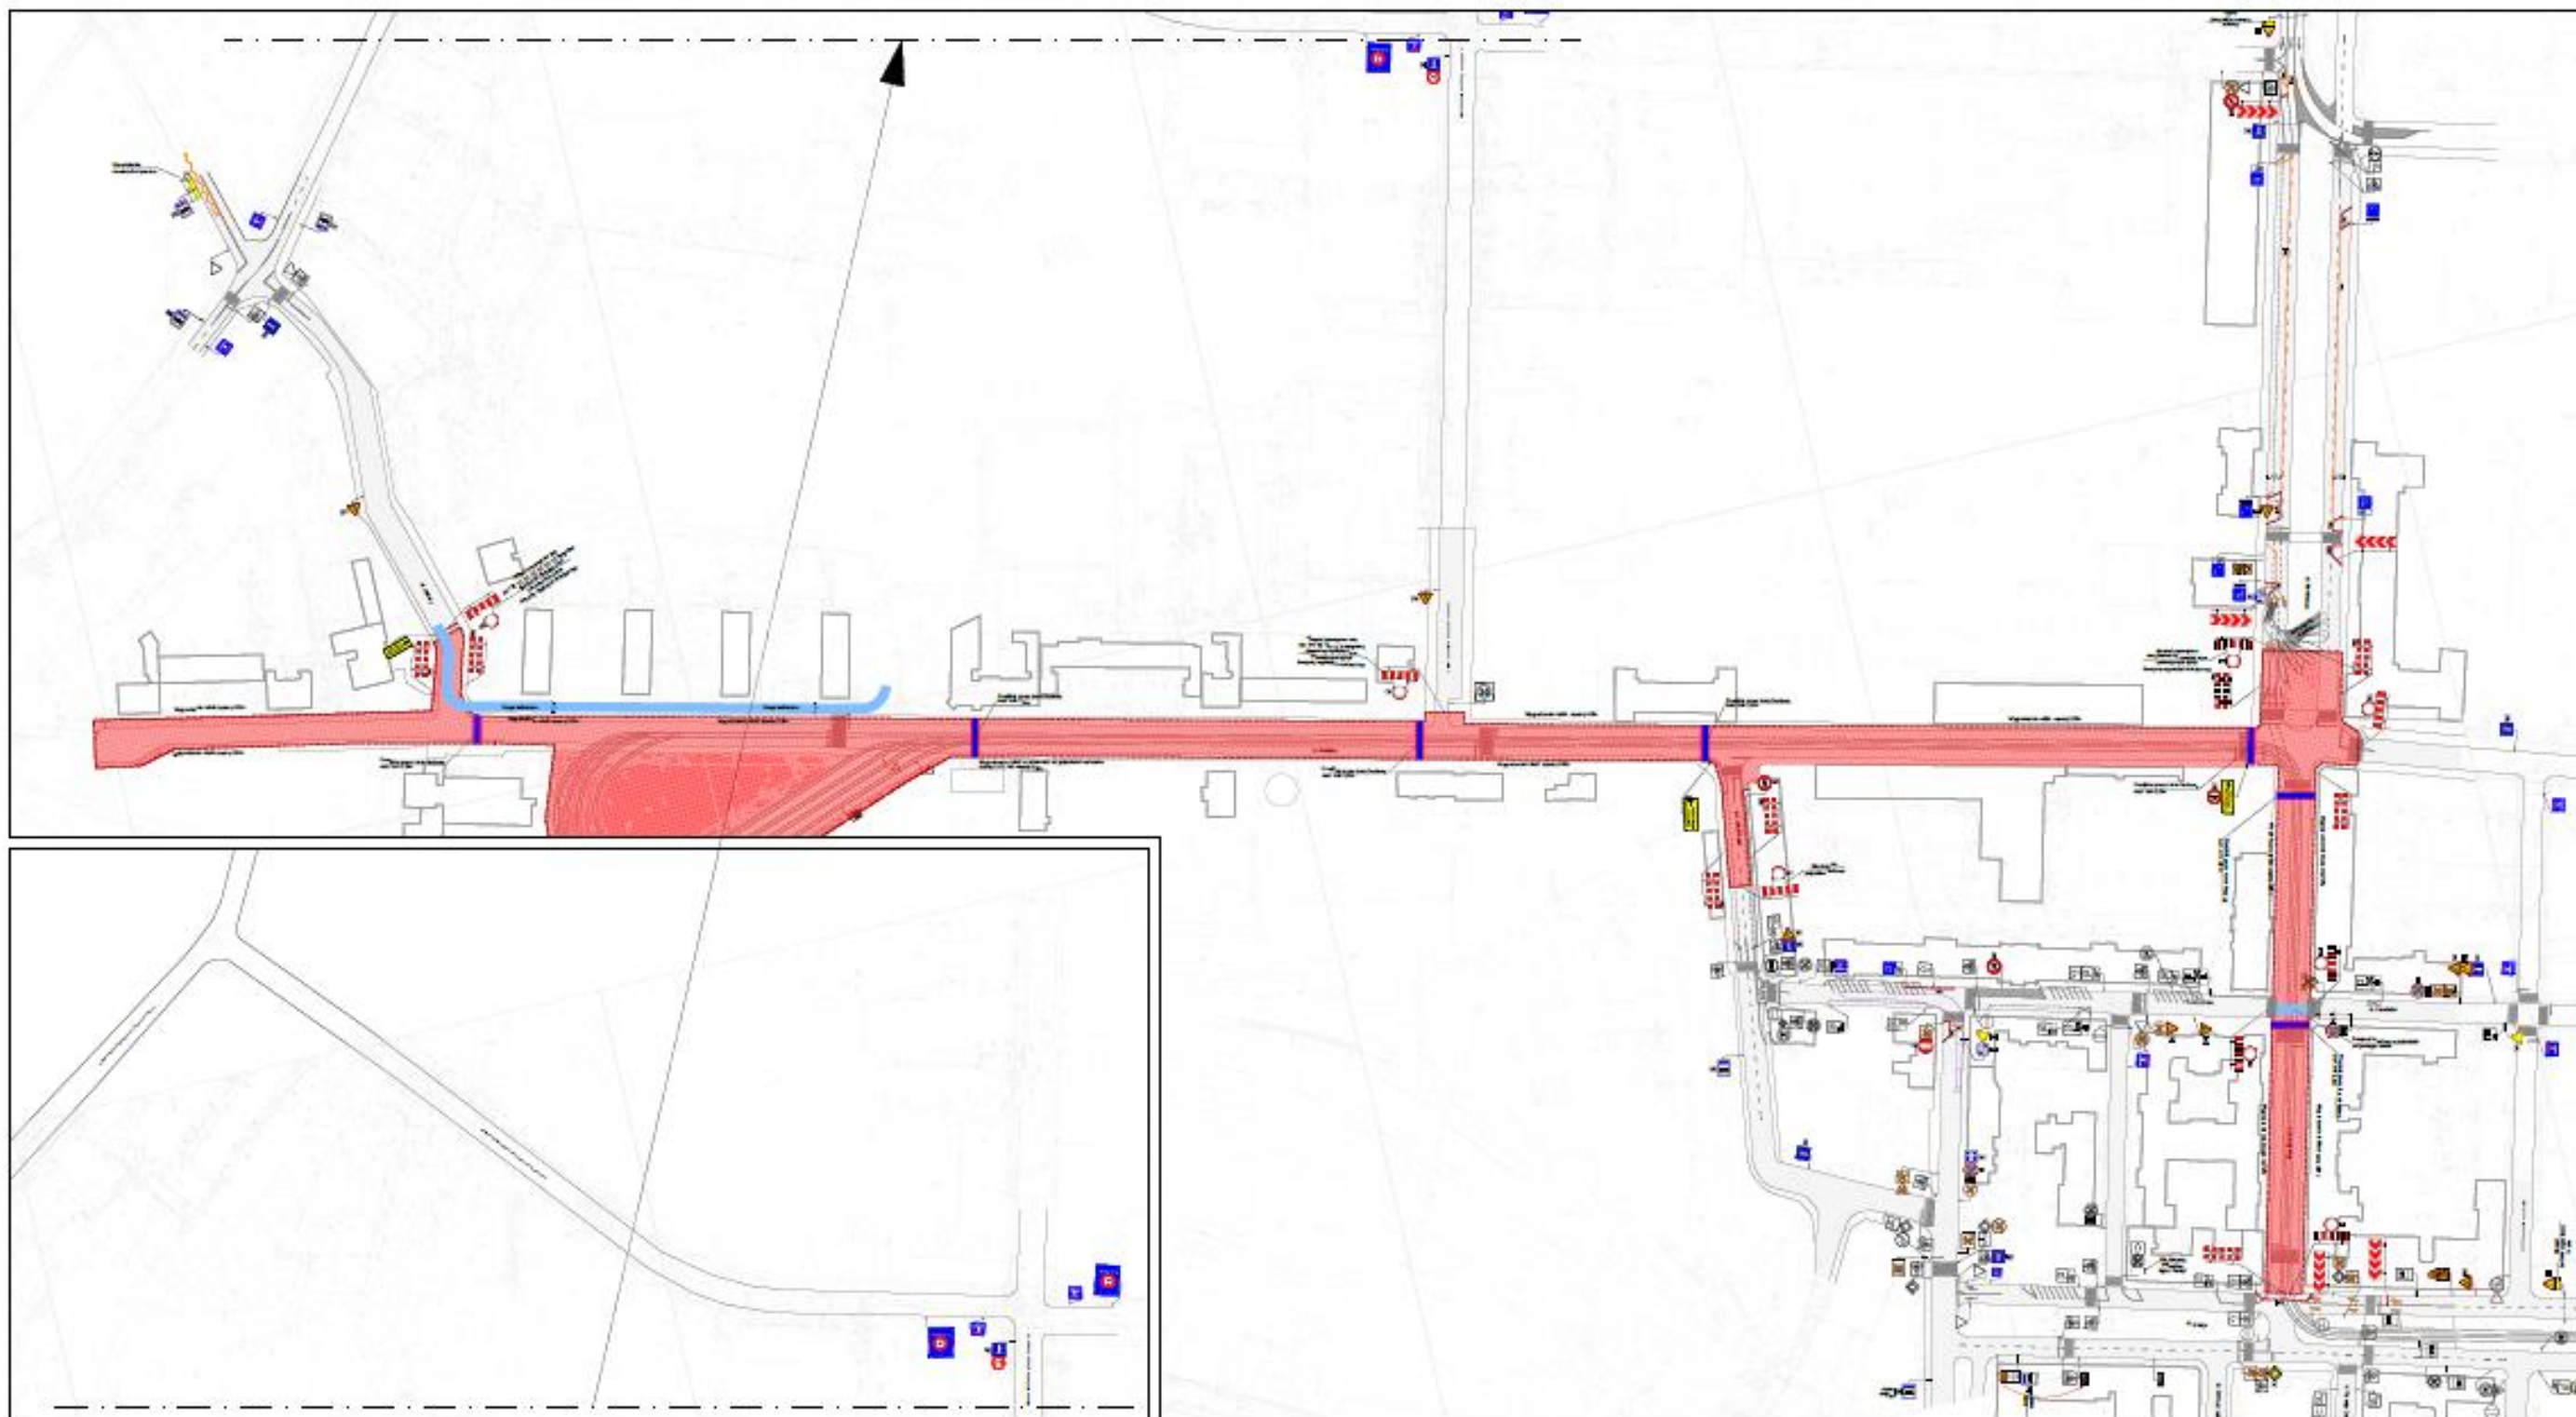

Plan organizacji ruchu – etap 2b
