



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 78

O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE

za okres 11.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

data aktualizacji 17.04.2015 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

1. Nazwa i numer Projektu.

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.

2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 67,9917708547% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Wartość Projektu | 37 217 082,23 PLN |
| Kwota dofinansowania | 18 000 000,00 PLN |

3. Strony procesu inwestycyjnego

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Zamawiający:</i> | Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin |
| <i>Inżynier Kontraktu:</i> | NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin |
| <i>Nadzór Autorski:</i> | Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin |
| <i>Wykonawca:</i> | ENERGOPOL-SZCZECIN SA ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin |

4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zaakceptowana Kwota Kontraktowa | 28 702 134,23 PLN netto |
| | 6 601 490,87 PLN należny podatek VAT |
| | 35 303 625,10 PLN brutto |

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- rozkładano geowłókninę i tłuczeń kamienny pod torowisko EPT na pętli tramwajowej, ul. Potulicka;
- kontynuowano ustawianie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem na terenie pętli tramwajowej, ul. Potulicka;
- ustawiono szyny na ulicy Potulickiej do nr 14;
- wykonano skrzynki odwadniające w torowisku na wysokości ul. Czarnieckiego;
- wykonywano regulację torów oraz betonowanie warstwy dolnej i górnej podbudowy betonowej na ul. Potulickiej, na wysokości ul. Sowińskiego w kierunku pętli tramwajowej;
- kontynuowano układanie chodnika oraz ustawianie krawężnika kamiennego na ul. Potulickiej, Narutowicza – ul. Czarnieckiego (strona prawa),
- kontynuowano regulację wysokościową wejść do budynków na ul. Narutowicza;
- układano i profilowano kruszywo w pasie drogowym na odcinku ul. Narutowicza – ul. Czarnieckiego oraz ul. Potulicka – ul. Sowińskiego.

8. Dokumentacja fotograficzna



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka - pętla tramwajowa





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka





PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka

9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia


W dniu 28.01.2015 r. na terenie budowy wprowadzona została czasowa organizacja ruchu - etap 2b, zgodnie z zatwierdzeniem C-157/2014 z dnia 22.08.2014 r. W stosunku do poprzedniego etapu (2a), utrzymane zostanie takie samo oznakowanie, zmieni się natomiast obsługa budowy od strony budowy osiedla Pionierów – dojazd od strony osiedla Pionierów odbywać się będzie drogą tymczasową od strony ulicy Piekary.

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

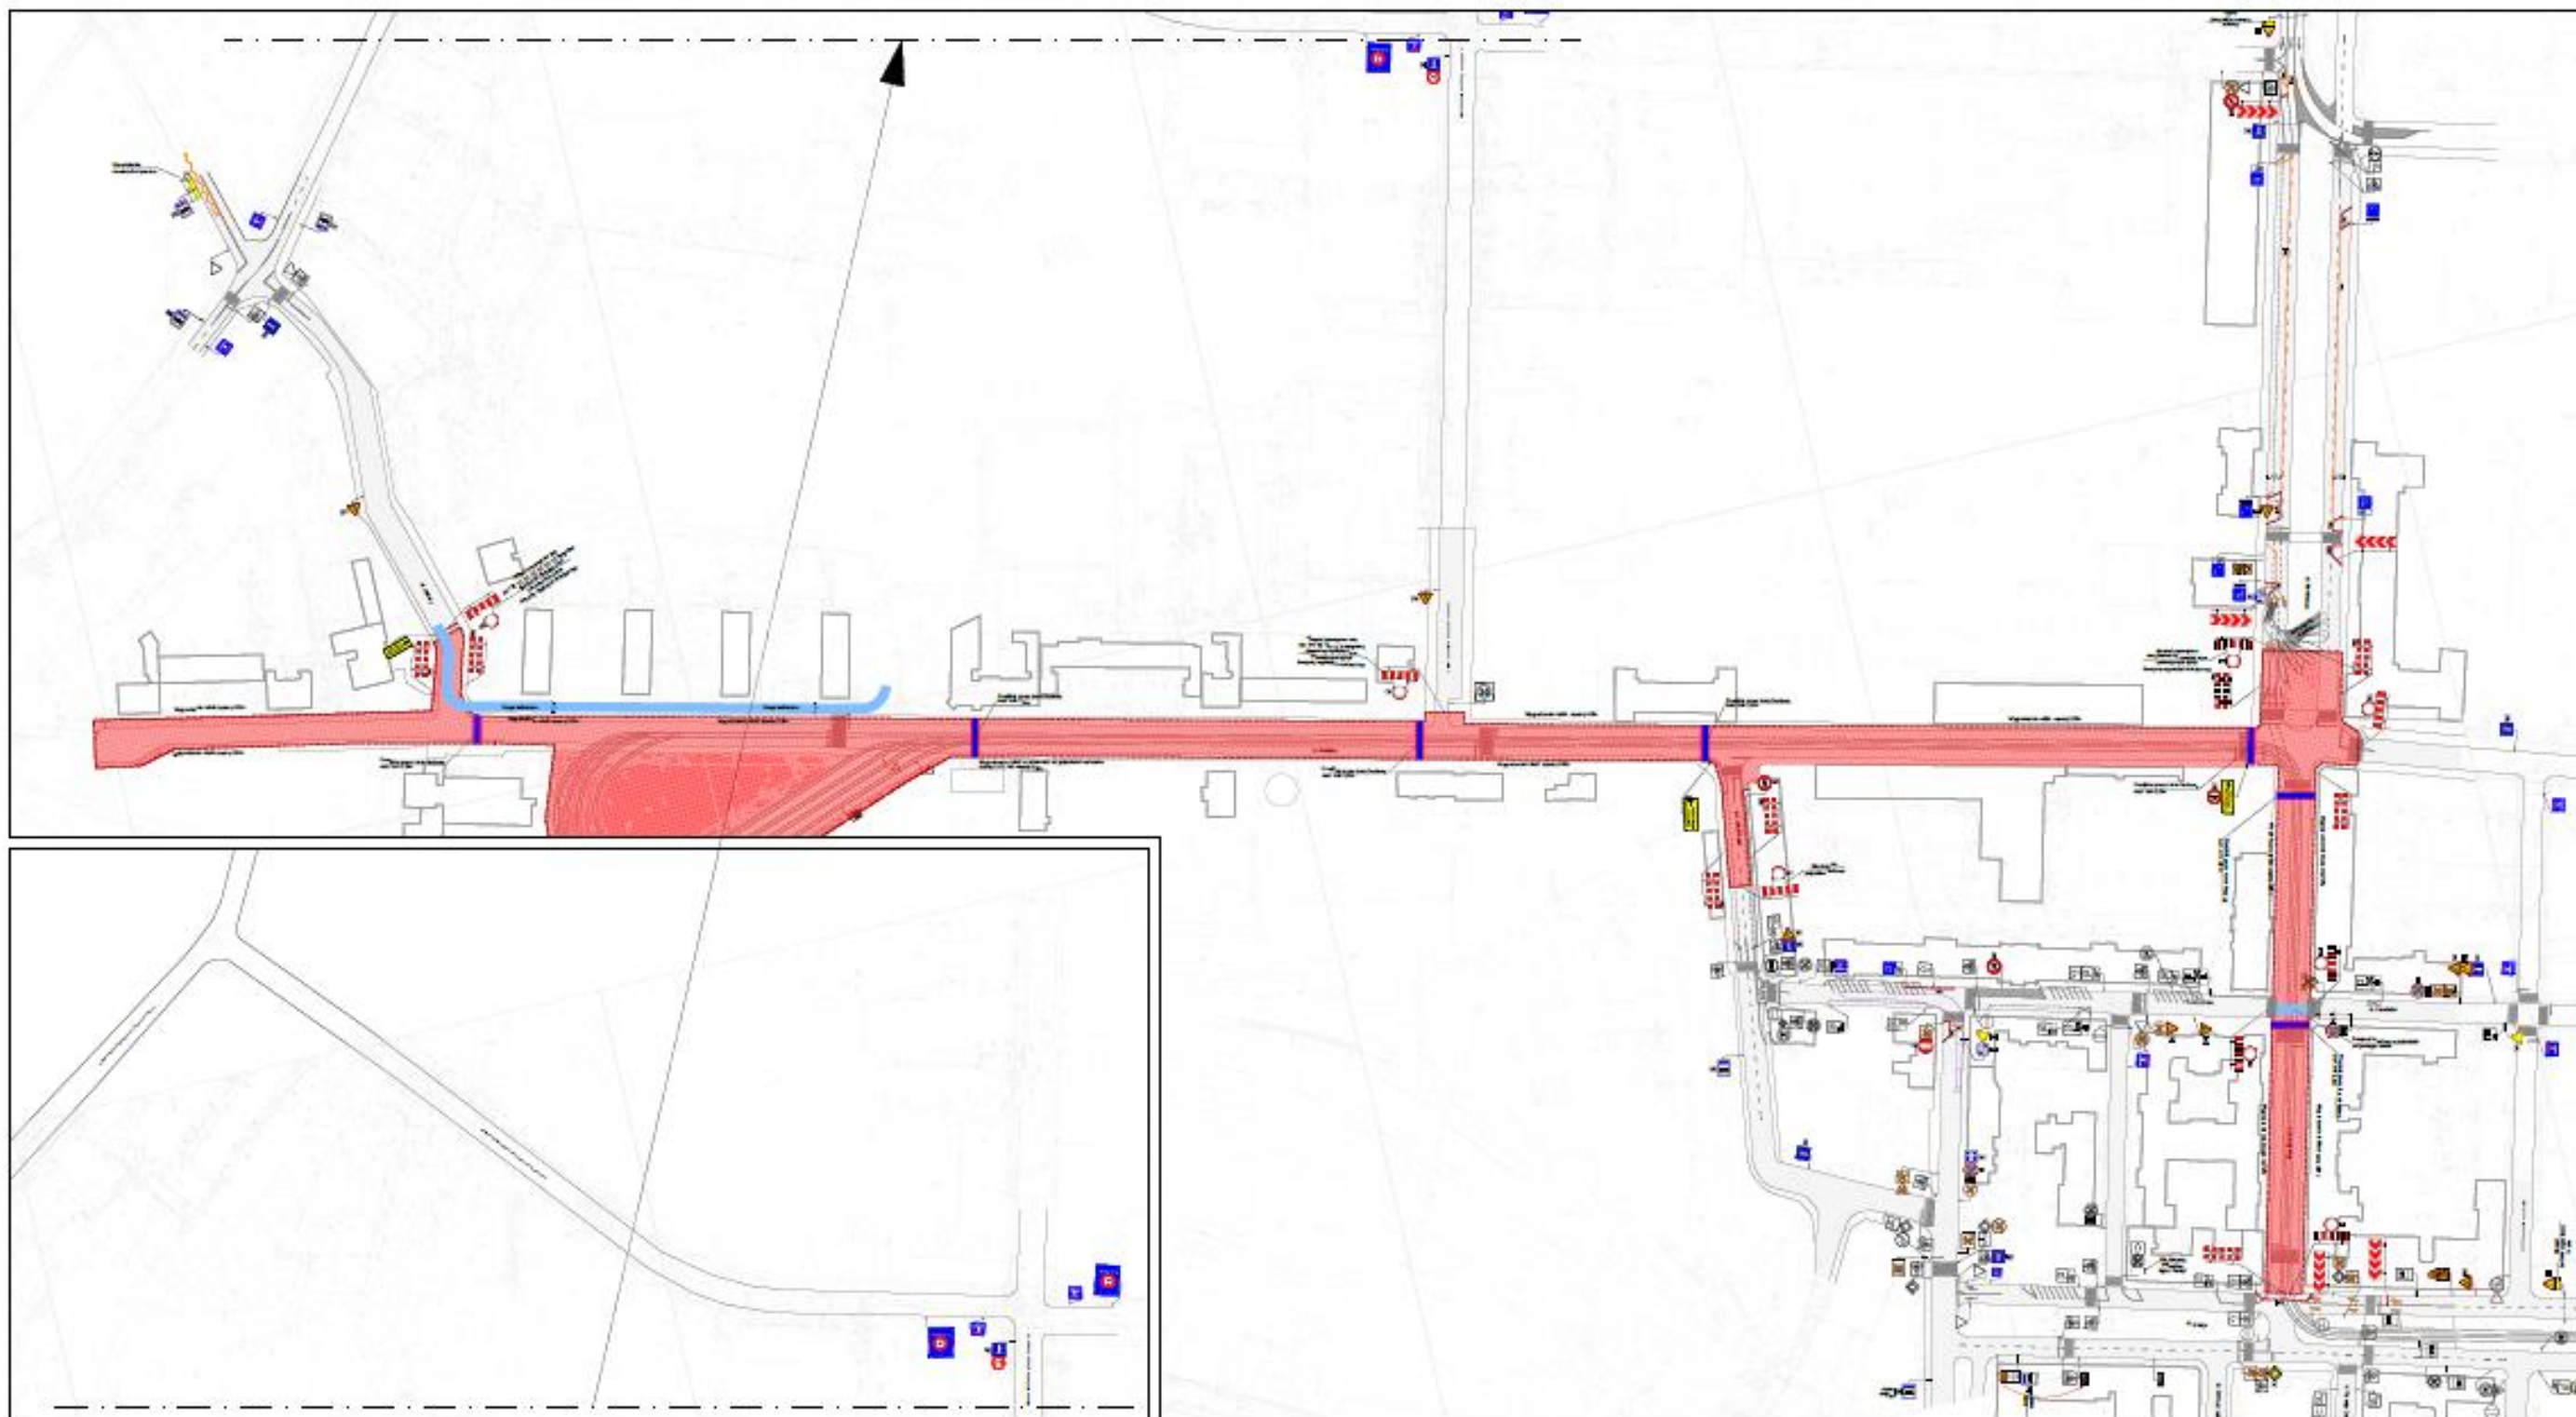

Plan organizacji ruchu – etap 2b
