

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 36**

### **O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE**

**za okres 14.06.2014 r. – 20.06.2014 r.**

data aktualizacji 20.06.2014 r.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

### **1. Nazwa i numer Projektu.**

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.

### **2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 67,9917708547% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

Wartość Projektu	37 217 082,23 PLN
Kwota dofinansowania	18 000 000,00 PLN

### **3. Strony procesu inwestycyjnego.**

*Zamawiający:* Gmina Miasto Szczecin  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

*Inżynier Kontraktu:* NBQ Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin

*Nadzór Autorski:* Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM  
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

*Wykonawca:* ENERGOPOL-SZCZECIN SA  
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

### **4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane**

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 28 702 134,23 PLN netto

---

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

6 601 490,87 PLN należny podatek VAT  
35 303 625,10 PLN brutto

## 5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – *24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.*

## 6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacji kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---



Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

## **7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu**

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- kontynuowane są prace przy kanalizacji deszczowej od ul. Narutowicza w kierunku ul. Czarnieckiego;



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

- trwają prace montażowe przy rurociągu gazowym w ul. Potulickiej, od ul. Sowińskiego w kierunku osiedla Pionierów II, Wykonawca wszedł z robotami w obszar skrzyżowania ul. Potulickiej z ul. Sowińskiego;
- w ramach prac renowacyjnych przy kanale ogólnospławnym w ul. Narutowicza zakładano „kapelusze” na przyłączy;
- kontynuowany jest montaż sieci ogólnospławnej od ul. Czarneckiego w kierunku ul. Sowińskiego;
- kontynuowane są wykopy pod fundamenty słupów trakcyjnych w ul. Potulickiej;
- rozpoczęto układanie chodnika na odcinku ul. Narutowicza, pomiędzy ul. Kaszubską a ul. 3 Maja, po stronie budynku Sądu;
- przystąpiono do rozbiórki wiaty na terenie policji – prace zostały wstrzymane ze względu na nieprzestrzeganie zasad Bhp dotyczących demontażu i składowania wyrobów budowlanych z zawartością azbestu;
- przerwane zostały roboty na pętli tramwajowej w ul. Potulickiej z powodu ujawnienia szczątków ludzkich i fragmentów trumien;
- na odcinku ul. Narutowicza, pomiędzy ul. Kaszubską a ul. 3 Maja, wykonano doziarnienie koryta ziemnego drogi i torowiska;
- na odcinku ul. Narutowicza, pomiędzy ul. Kaszubską a ul. 3 Maja, przystąpiono do układania warstwy gruntu stabilizowanego cementem w korycie torowiska i jezdni.

## 8. Dokumentacja fotograficzna



ul. Potulicka





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka



Inżynier Kontraktu:  
NBQ Spółka z o.o.  
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C  
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12







**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

 **Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



rozbiórka hali przy ul. Potulickiej



Inżynier Kontraktu:  
NBQ Spółka z o.o.  
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C  
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12







**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. 3 Maja



Inżynier Kontraktu:  
NBQ Spółka z o.o.  
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C  
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia**

Od dnia 15.04.2014 r. Wykonawca wprowadził zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Wdrożony został etap 2a projektu „Czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Potulickiej w Szczecinie”, zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina (decyzja z dnia 17.02.2014 r., znak: WGKiOŚ-III.7221.C-066.2014.WD, nr zatwierdzenia: C-066/2014).

W dalszym ciągu wiążące są zamknięcia z etapu pierwszego obejmujące ul. Piekary oraz ul. Czarnieckiego. Dodatkowo z ruchu wyłączona została ul. Potulicka na odcinku od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Narutowicza wraz z tym skrzyżowaniem oraz ul. Narutowicza. Na ul. Narutowicza, pomiędzy Pl. Dziecka a ul. Potulicką, ruch został ograniczony do jednego pasa ruchu. Przed obszarem wyłączonym z ruchu wykonany został tymczasowy przejazd przez pas rozdziału umożliwiający zawracanie.

Przez plac budowy zapewnione zostały dojazdy do posesji dla mieszkańców, zaopatrzenia, służb komunalnych i ratunkowych jednak bez możliwości postoju w tym obszarze. Wzdłuż ul. Potulickiej, na placu budowy, wytyczono ciągi piesze – na ul. Potulickiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Narutowicza a ul. Czarnieckiego ciąg jednostronny, na pozostałym odcinku ul. Potulickiej oraz ul. Narutowicza ciągi dwustronne.

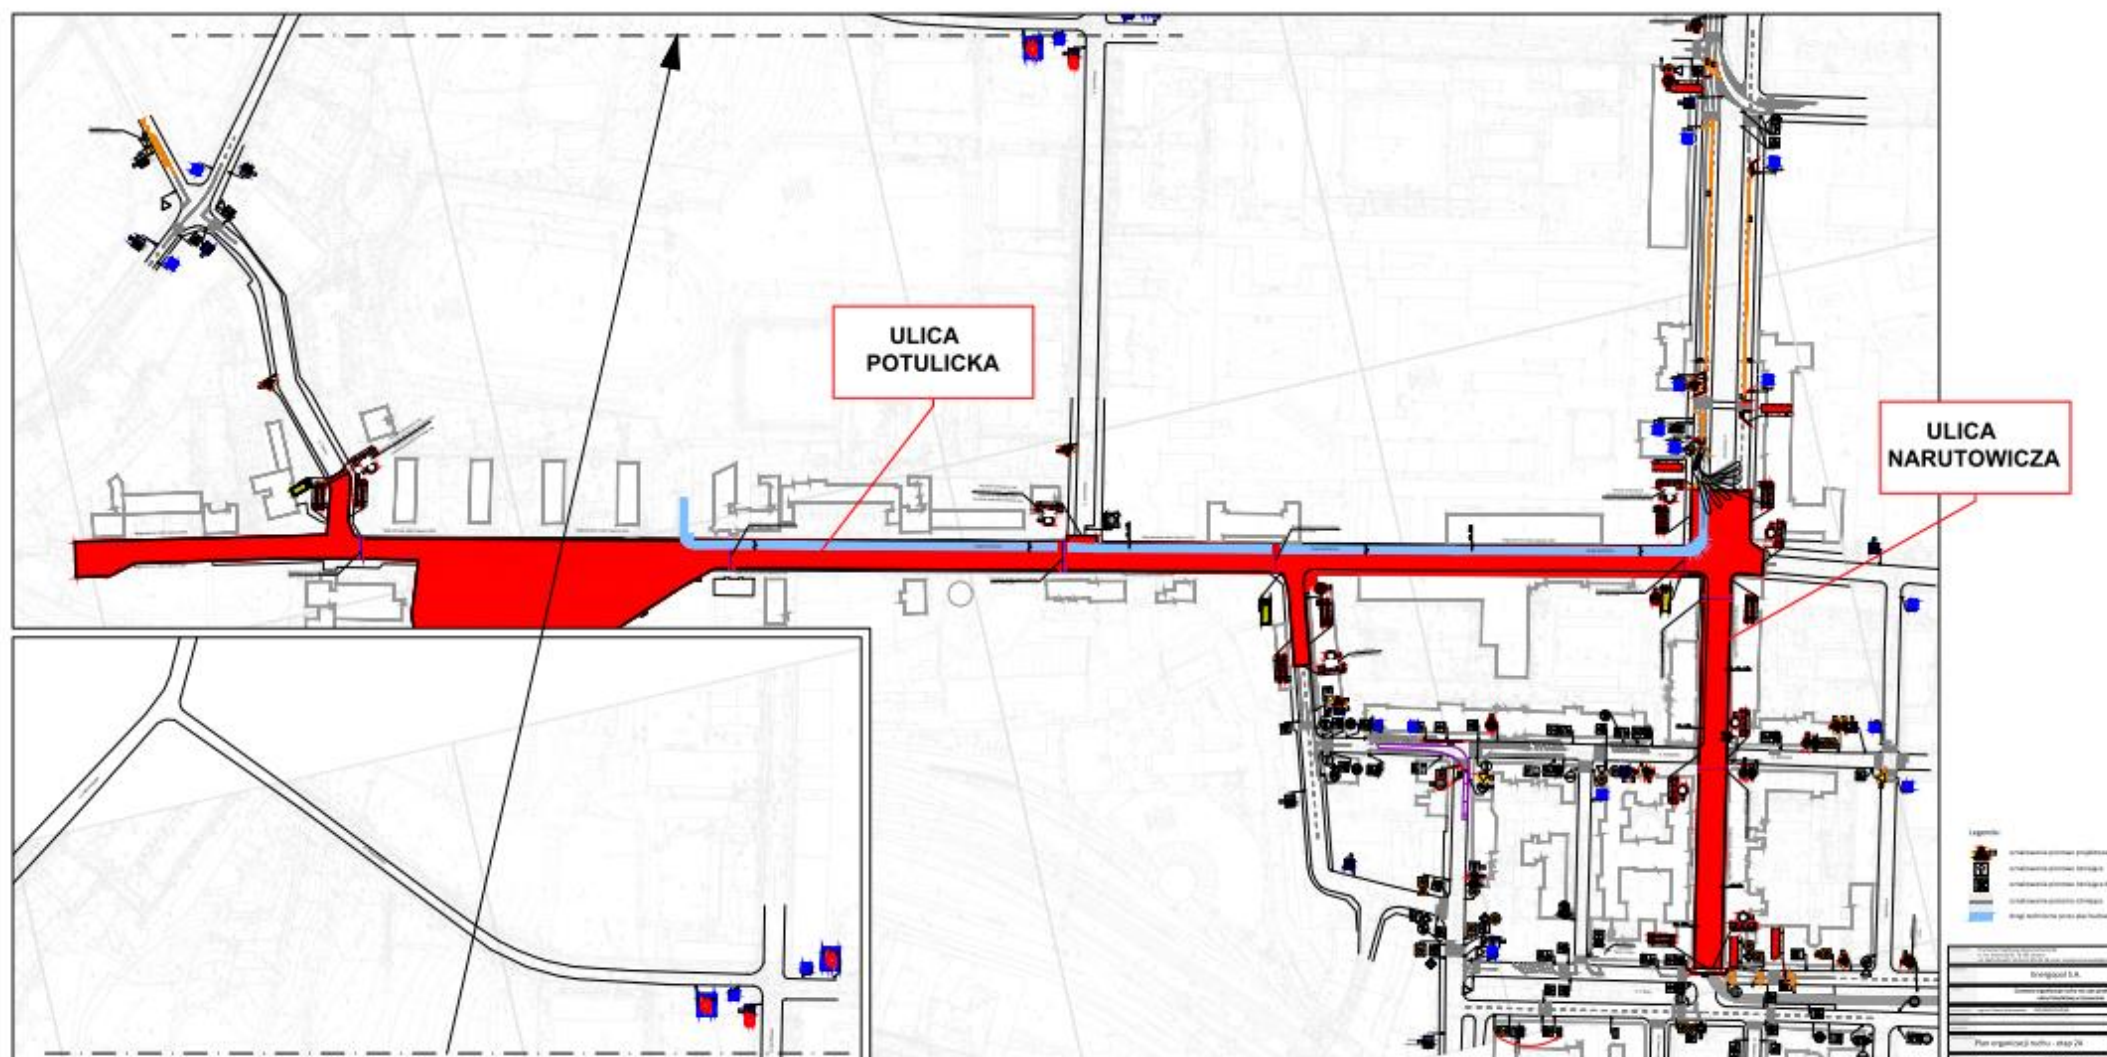
Zamiennie, za wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 1 i 9, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową - pomiędzy ul. Czarnieckiego a Bramą Portową kursuje linia nr 801, a pomiędzy ul. Grudziądzką a ul. Szyrockiego linia nr 809.

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska






„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



Legenda:

-  oznakowanie pionowe projektowan
-  oznakowanie pionowe istniejące
-  oznakowanie pionowe istniejące do
-  oznakowanie poziome istniejące
-  drogi techniczne przez plac budowy

Plan organizacji ruchu – etap 2a

Inżynier Kontraktu:  
NBQ Spółka z o.o.  
adres do korespondencji: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3C  
tel. 91 423 74 68, fax 91 423 26 12
