



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

## **MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 97**

### **O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE**

**za okres 15.08.2015 r. – 21.08.2015 r.**

data aktualizacji 21.08.2015 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

---

### **1. Nazwa i numer Projektu.**

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r.  
wraz z Aneksami

### **2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 74,9999999717% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Wartość Projektu     | 37 335 204,03 PLN |
| Kwota dofinansowania | 17 999 999,00 PLN |

### **3. Strony procesu inwestycyjnego**

*Zamawiający:* Gmina Miasto Szczecin  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

*Inżynier Kontraktu:* NBQ Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin

*Nadzór Autorski:* Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM  
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

*Wykonawca:* ENERGOPOL-SZCZECIN SA  
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

### **4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zaakceptowana Kwota Kontraktowa | 28 673 175,42 PLN netto              |
|                                 | 6 594 830,35 PLN należny podatek VAT |

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

35 268 005,77 PLN brutto

## 5. Terminy

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.

## 6. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z infrastrukturą techniczną;
- przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej;
- renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.


---

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

## **7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu**

- Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie nr CRU 13/0003350 z dnia 26.09.2013 r. zakresem;
- prowadzone są roboty brukarskie na ul. Potulickiej i na pętli tramwajowej;
- trwa wykuwanie rowka przyszynowego na zalewkę bitumiczną wraz z zalewaniem masą zalewową – bigumą na ul. Potulickiej oraz na ul. 3 Maja;
- kontynuowano szlifowanie szyn w ciągu ul. Potulickiej.

## **8. Dokumentacja fotograficzna**

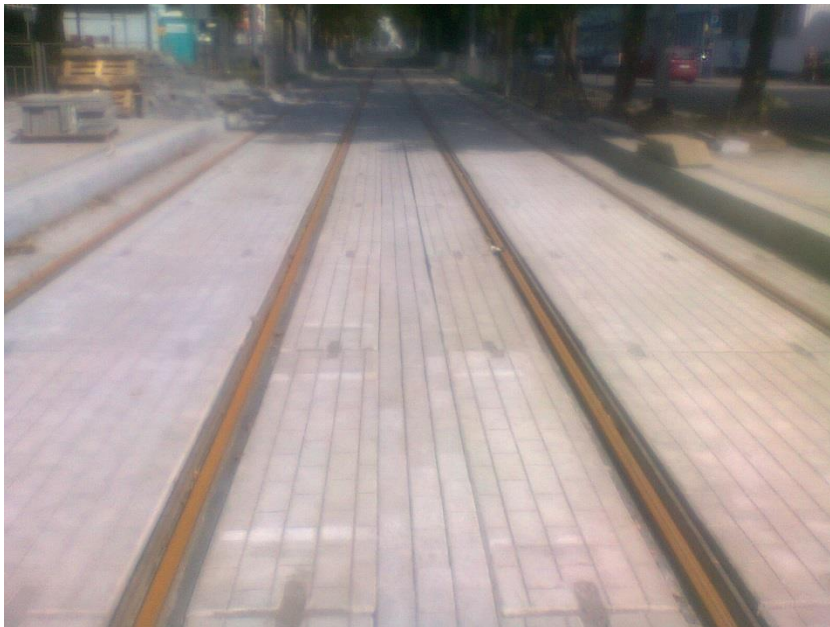

ul. 3 Maja





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



skrzyżowanie ul. Potulickiej i Narutowicza





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka







**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

**Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.



ul. Potulicka, pętla tramwajowa



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.


Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26. 09.2013 roku.

## 9. Komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia

W dniu 15.07.2015 r. na terenie budowy wprowadzona została czasowa organizacja ruchu - etap 3a, zgodnie z zatwierdzeniem C-319/2015 z dnia 23.06.2015 r. Obowiązują nadal zamknięcia z etapu 2, oraz 3.

Plan organizacji ruchu – etap 3a

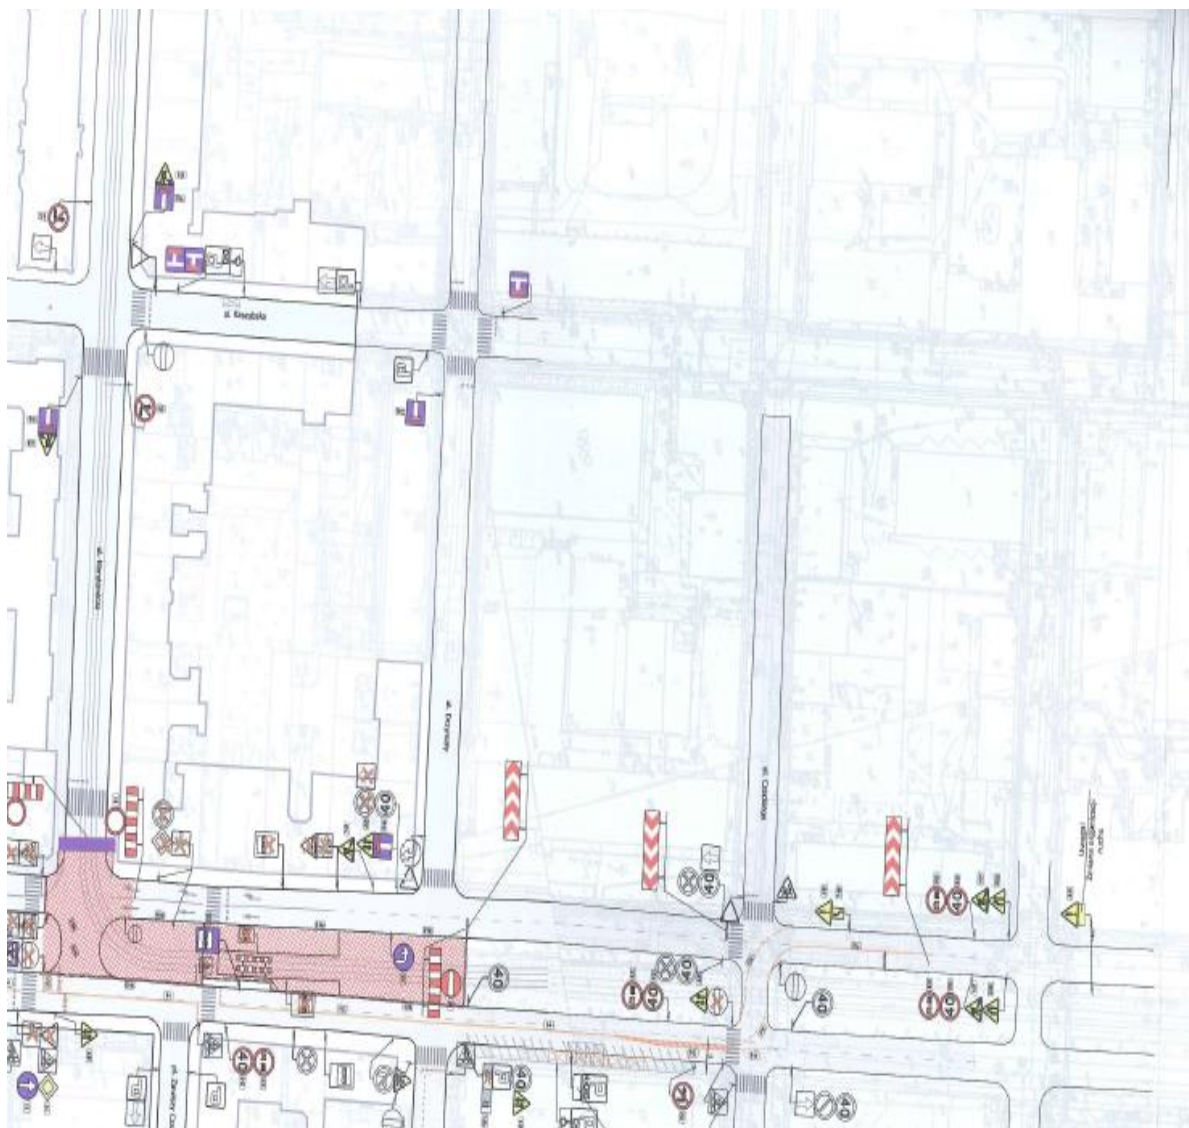

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska
